Compte-Rendu d'Intervention

Client			
Référence client		**Raison sociale**	
Adresse			
Code postal		**Ville**	

Résumé de l'intervention

Type d'intervention : Installation AT HOME

Catégorie d'intervention : Installation d'une borne de recharge

Date/Heure clôture :

Résultat de l'intervention : OK NOK

Commentaire du technicien :

Commentaires techniques :

Signature technicien	Signature client
NOM – PRENOM :	NOM – PRENOM :

Débrief

Information classification: Internal

Je détecte une ou des non-conformités sur l'installation électrique	NON
Type d'installation	MONO
Commentaire	
Résultat de l'intervention	Intervention OK pour la supervision
Cause de l'échec	RAS
Feu vert sécurité sur IZI Safety effectué	OK
Support contacté pour validation de la Mise en service	OUI
Commentaire support	
Y-a-t-il d'autres photos avant installation à ajouter ?	
CONFIGURATION DE LA STATION DE CHARGE	OK
Nombre de points de charge du pool	1
Puissance souscrite (kVA)	9
Puissance disponible au niveau du TD pour les bornes (kVA)	Puissance souscrite moins puissance max soutirée
Puissance installée (kVA)	7 kW
La puissance disponible au niveau du TD est-elle inférieure à la puissance	Oui
Si oui, avez-vous réalisé le paramétrage du smartcharging lors de la MES	Oui
Le tore de mesure est-il installé en amont de tous les appareils électriques	Oui / SMART SENSOR
Les champs "POWER SUBSCRIPTION" (puissance souscrite en kVA)	A renseigner dans la configuration une des valeurs suivantes : 9
Valeur saisie dans "POWER SUBSCRIPTION" en kVA	9
L'écran de l'interface installation indique bien SMARTCHARGING OK	Oui
Photo Smart charging avec câblage	
INSTALLATION ELECTRIQUE, AU NIVEAU DU TABLEAU DIVISIONNAIRE	
Régime de neutre de l'infrastructure	TT
Indiquer les valeurs relevées pour les tensions phases / terre	231

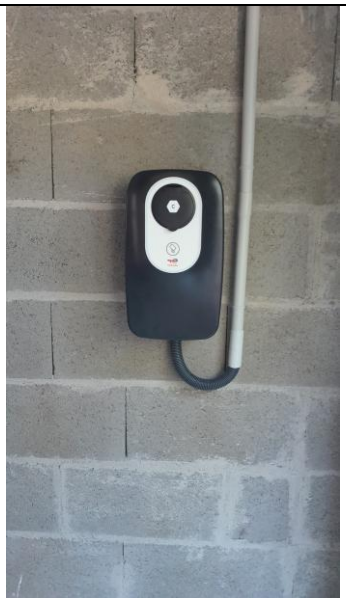
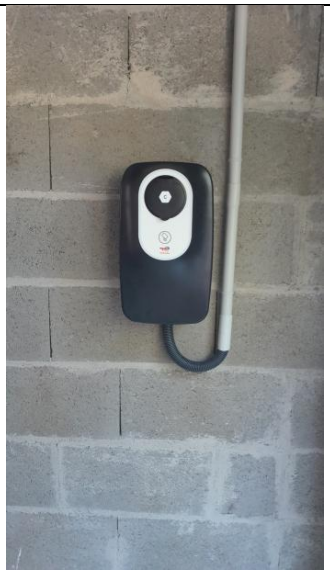
Information classification: Internal

Indiquer la valeur de la terre	11 Omhs
Indiquer la valeur de la mesure neutre / terre	0
ALIMENTATION DE L'EV CONTROLLER	
Présence d'un réseau 3G au niveau de l'EV Controller	
Les LEDs de l'EV Controller s'allument correctement et l'HM de l'EVC	
ONGLET "NETWORK" DE L'EVC LORS DE LA MES	
L'EVC est à l'heure	
La carte SIM est connectée au réseau 3G	Oui
Check Internet avec WatchDog	
COMMUNICATION WIFI	
Fréquence du Wifi du client	Non applicable
Signal Wifi du client à l'emplacement de la borne	Non applicable
Si le signal est faible ou moyen, avez-vous bien installé un répéteur Wifi à	Non applicable
Si le signal est faible ou moyen, avez-vous bien installé un répéteur Wifi à	Non applicable
Photo Interface borne avec WiFi OK	Non applicable
CARACTERISTIQUE PDR	
Puissance de la borne	7 kW
Succès connexion Hotspot Wifi émis par la borne (Cf. Guide Installation,	Non applicable
Succès de l'appairage de la borne au Wifi du client (Cf. Guide Installation,	Non applicable
La date et l'heure de la borne affichées sur l'écran de synthèse sont bien	Non applicable
Résultat Show OCPP	Non applicable
Test simulateur VE	SIMULATEUR
Commentaire	
Réserves	

Information classification: Internal

Y-a-t-il d'autres photos supplémentaires à ajouter ?	
Photo supplémentaire	
Y-a-t-il d'autres photos supplémentaires à ajouter ?	
Photo supplémentaire	
Y-a-t-il d'autres photos supplémentaires à ajouter?	

Photos

Photo avant Installation (obligatoire)	
Photo après installation	

Information classification: Internal

Photo Smart charging avec câblage	
Photo de la Valeur de la terre	

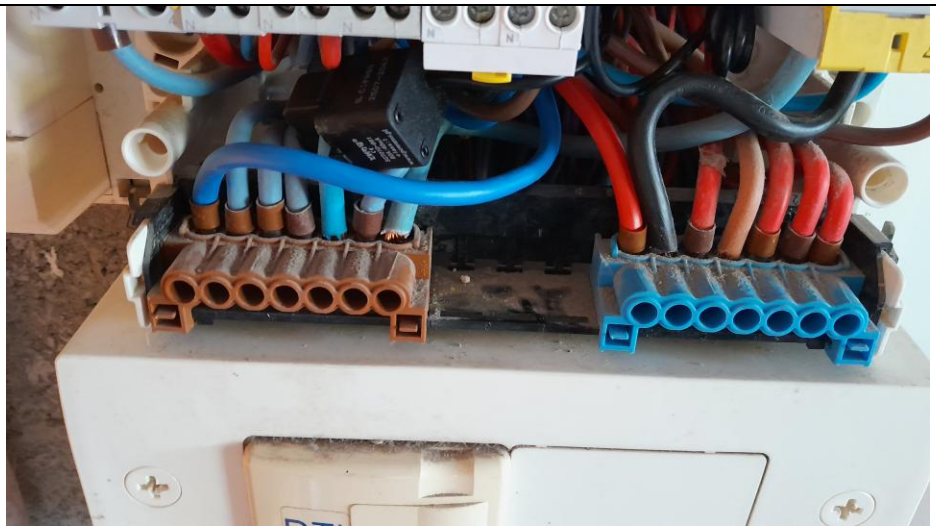
Information classification: Internal

Photo Interface borne avec WiFi OK (non applicable ne pas remplir)	
Photo LISIBLE numéro de série (obligatoire)	
Vue d'ensemble de la borne installée et alimentée (+pied si existant) : Les LED doivent être vertes fixes	

Information classification: Internal

Vue de l'intérieur de la borne	
Tableau général fermé	
Tableau général ouvert	

Information classification: Internal

Protections installées (possible de remettre la même photo si l'appareillage du smartcharging est dessus, comme sur la page 5)	
Percement(s)	
Tore avec sens de la flèche (faire en sorte au maximum que la flèche soit visible et que la photo soit NET dans la mesure du possible) **Si photo floue = photo refusée = PV refusé**	 FLECHE DANS LE TOR – SMART SENSOR

Information classification: Internal

Cheminement du câblage	
Borne branchée avec simulateur OK sauf si le VE est disponible	
Borne branchée avec la voiture si possible (obligatoire si VE disponible)	

Information classification: Internal

Photo supplémentaire (puissance d'abonnement au Linky, max soutiré au Linky (si Linky disponible et prendre photo de l'endroit si indisponible)	 

Information classification: Internal
